

# Betriebsausschuss 04.03.2015

## TOP 4


### Sachstandsbericht

### Aktuelle Investitionsvorhaben

### im Kanalnetzbereich 2015 ff

1. Zahlen und Fakten: Baumaßnahmen/Bausummen/Bauprogramme
2. Überblick Bauzeitenpläne
3. Überblick Lage der Einzelbaustellen
4. Einblicke in die Helmstedter Unterwelt / Arbeitsprozesse AEH
5. Planungsdetails ausgewählter Baumaßnahmen

**Eine**



**-aufgabe**

**liegt vor uns!**

**Schlusswort aus meiner Präsentation  
des Eigenbetriebs AEH am  
14.02.2012 an gleicher Stelle.**

**Abwasserentsorgung Helmstedt**  
**Investitionsprogramm aus HP 2015, 1. Nachtrag**

Termine BTA 03. Mrz 15. Apr

17. Nov


Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Termine BTA				Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin)																	
				LV Erstellung bis	Versand/ Veröffentlich.	Submission	Auftrags- vergabe	Mär	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec								
Sammelposten 2013 Baumaßnahmen				erl.																					
Kanalerneuerung Marienstraße		350.000,00			Planungsbeginn entsprechend Personalkapazität																				
Kanalerneuerung Tangermühlenweg		220.000,00		09. Feb	10. Feb	24. Feb	05. Mrz	16. Mrz	(160 m, DN 400 PE-HD, 3 S)					05. Jun											
Kanalerneuerung Lindenplatz/Holzberg		60.000,00		24. Feb	24. Feb	10. Mrz	20. Mrz			07. Apr	(80 m DN 250 PE-HD, 4 Schächte)					30. Aug									
Baugebiet Rottlande II 1. BA (2015 Planung)		70.000,00	380.000,00	Planungsbeginn und Honorarvertrag 2. Jahreshälfte																					
Baugebiet Ziegelberg 2. BA (2014 Planung)	60.000,00	330.000,00		25. Feb	06. Mrz	19. Mrz	01. Apr			08. Apr	(460 m PE-HD, 450 m Beton o.ä., 28 S)					30. Aug									
Dorfbreite Kanalneubau	80.000,00			bedarfsorientiert nach Fortschreitung Grundstücksverkauf																					
BV Wiesenstraße		0,00		SW-Kanalverlegung durch Investor (Planung bis 10 KW noch nicht vorgelegt), Bauüberwachung durch AEH erforderlich																					
Kanalerneuerung St. Barbara Weg	100.000,00			erl.																					
Kanalerneuerung Grubenweg	70.000,00			erl.																					
Kanalerneuerung Elzweg	70.000,00			05. Jan	05. Jan	27. Jan	05. Mrz				05. Mai			30. Jun											
Kanalsanierungen (wird für den Zeitraum 2016 ff. noch spezifiziert)			600.000,00																						
Oberflächenwasserableitu ng Sternberger Teich	800.000,00	1.370.000,00	1.220.000,00	1. Ausschreibung 2. Jahreshälfte																					
Liner-Sanierungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23. Jan	26. Jan	23. Feb	13. Mrz																		
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf																					
PS Emmerstedt Hoch- wasserschutzmaßn.	12.000,00			erl.																					
EDV-Software Ergänzung (ISYBAU aus TV)	7.000,00	8.000,00																							
Werkzeuge und Geräte*	8.000,00	10.000,00	5.000,00																						
Unvorhergesehenes als Ersatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00																						
<b>Investitionssummen inkl. Reste aus 2014</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>																						

**Bausumme Invest (inkl. Planung): ~2.750.000 €**

**Bausumme Reparatur (inkl. Rückst.): ~570.000 €**

**Baumassen: ~3,3 km Hauptkanäle; ~ 60 Schächte**

**Bausumme/Arbeitsstunde (2.000 h/a): ~1.660 €**

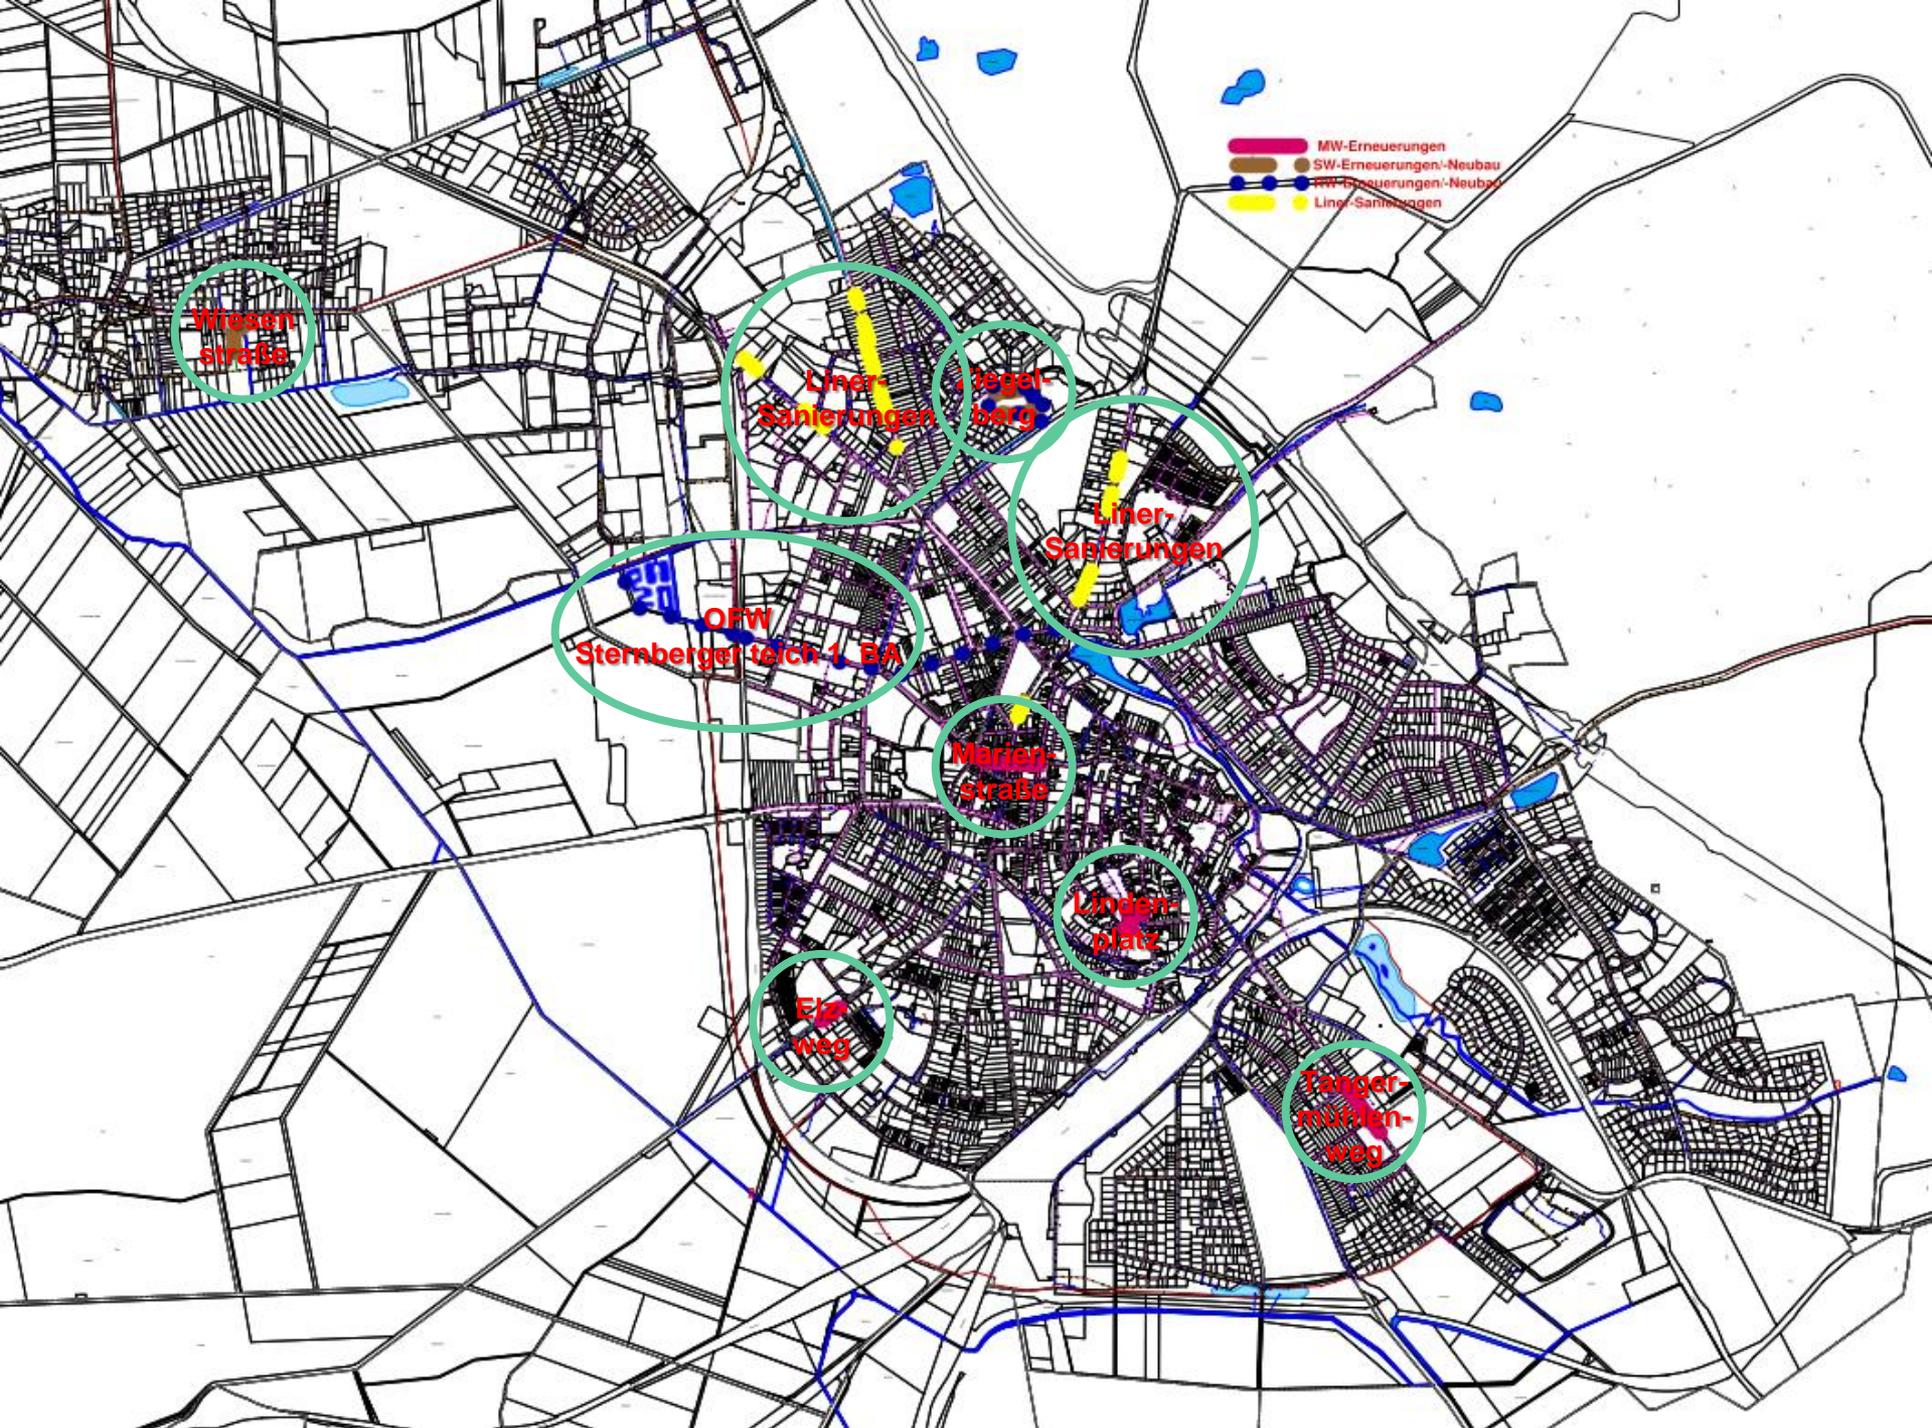

- MW-Erneuerungen
- SW-Erneuerungen/-Neubau
- FW-Erneuerungen/-Neubau
- Linien-Sanierungen

Wissenstraße

Linien-Sanierungen

Bebelberg

Linien-Sanierungen

OFW  
Sternberger reich 1. BA

Marienstraße

Lindenplatz

Elmweg

Tangermühlweg
